宮城県道路公社　建設部						みやぎ県北高速幹線道路 工事事務所															
部長		次長		副参事		所長		技術副参事		技術副参事		技術主幹		技術主幹		技術主幹		技術主幹		設計者	

工　事　仕　様　書

事業年度	令和元年度	工事番号	令和元年度 受(Ⅲ)道第9号
工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)　道路改良(1－6工区)工事　　実施　仕様書		
路線名	(主)築館登米線		
施工地名	登米市　迫町　北方　地内		
工期	契約締結の翌日　～　令和 3 年 3 月 25 日　まで　日間		

工　事　概　要

別紙のとおり。

設計表紙(甲)

工　事　概　要

施工延長　L=　426.0　m　　幅員　W＝6.5m(8.5m)

路体盛土工(ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ盛土)	V=	30,600	m3
路体盛土工	V=	6,900	m3
路床盛土工	V=	770	m3
植生工　(種子吹付)	A=	5,650	m2
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(橋台部)	A=	104	m2
1号函渠工 (B5.6m×H5.8m)	L=	15.6	m
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(1号函渠部)	A=	86	m2
排水構造物工		一	式

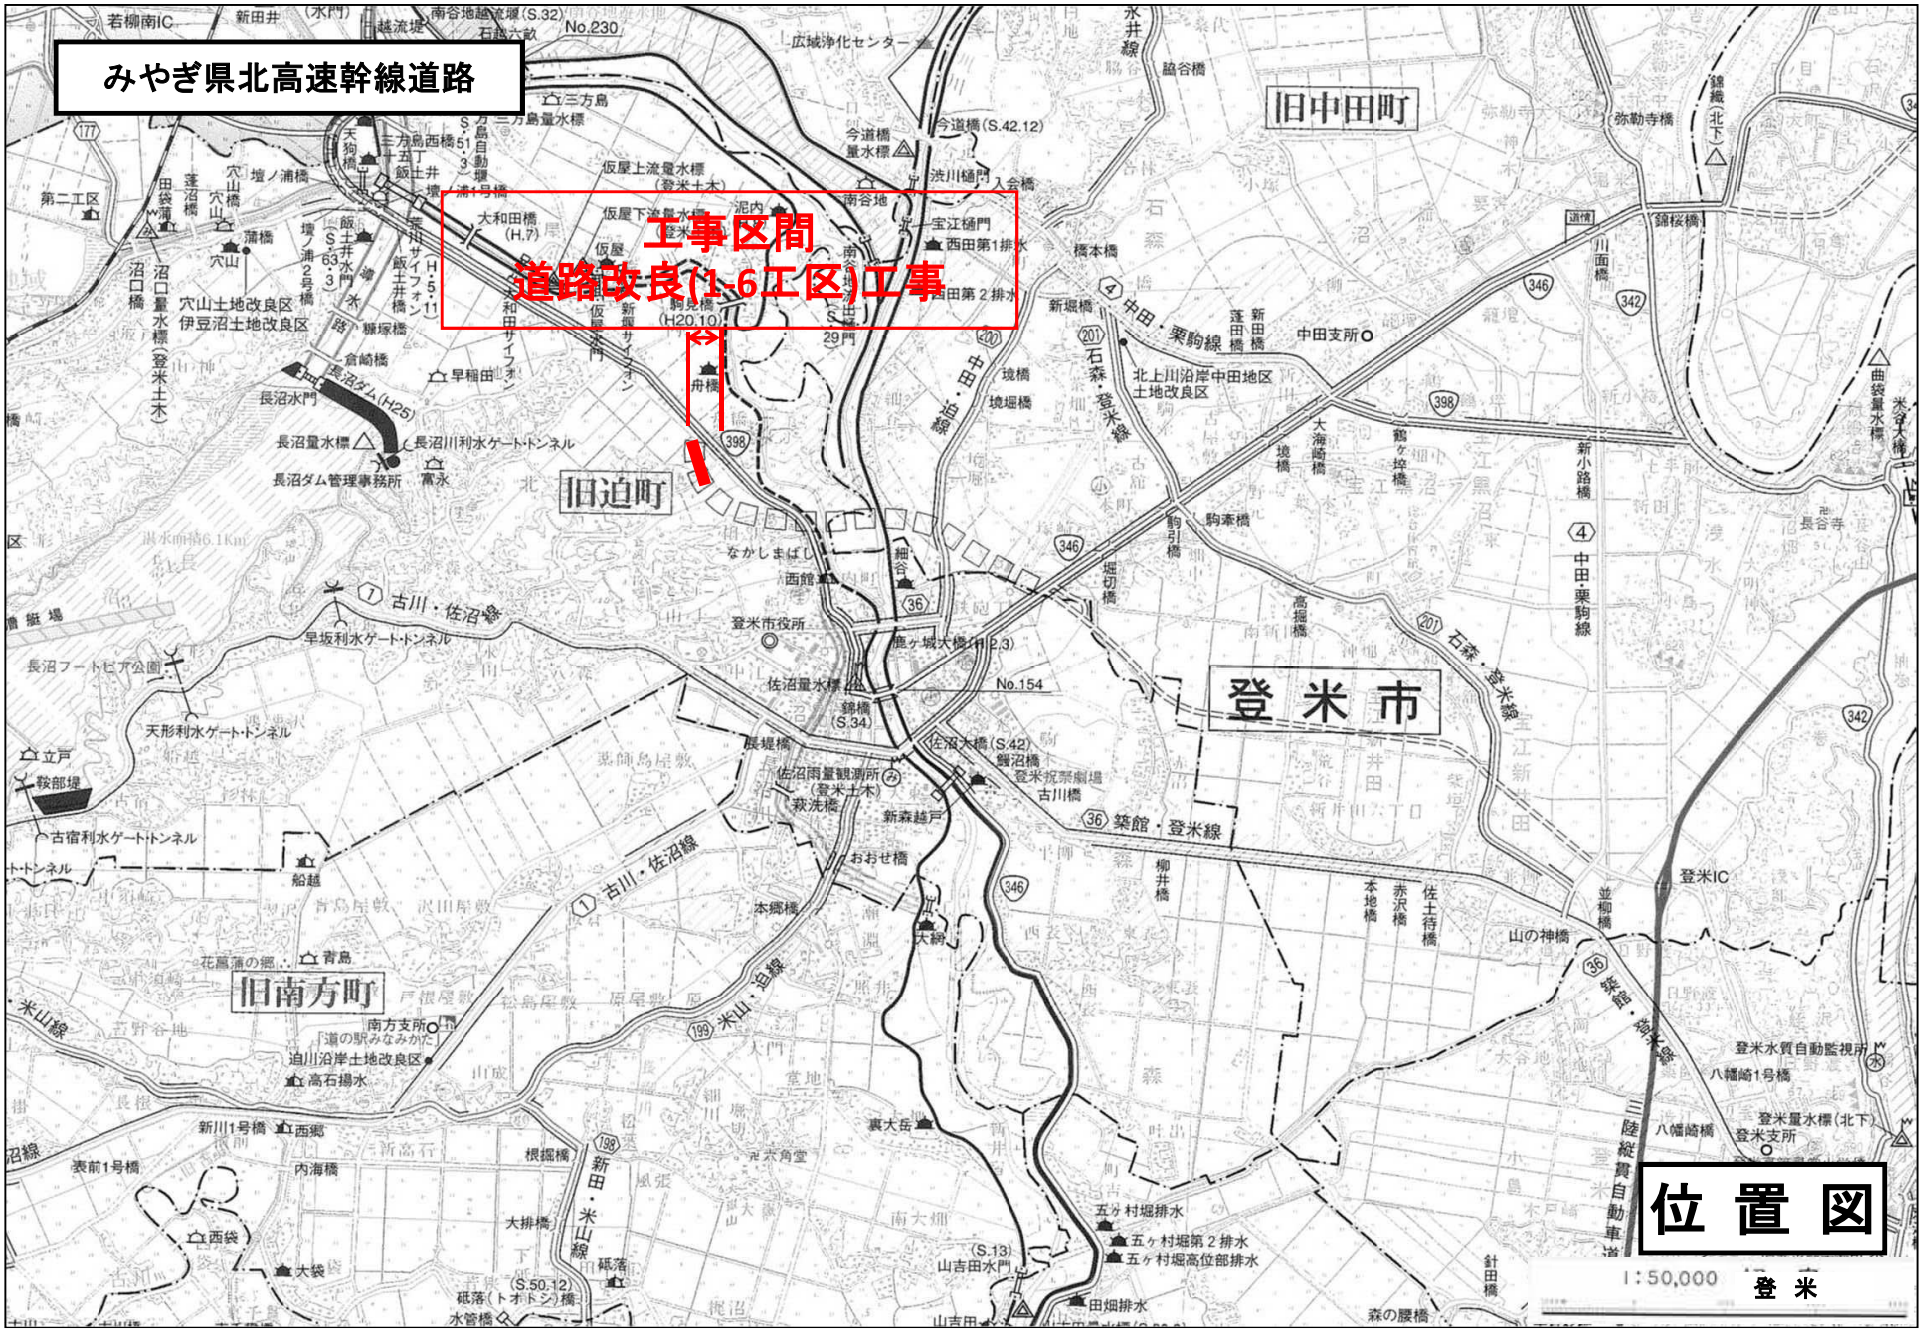
みやぎ県北高速幹線道路
工事区間
道路改良(1-6工区)工事
旧中田町
旧迫町
登米市
旧南方町
位置図
1:50,000
登米

ー 特 記 仕 様 書 ー

施 工 条 件 明 示 書

工事番号	令和元年度 受(Ⅲ)道第9号	工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事務所名	宮城県道路公社

項目	条件		内容	施工方法	備考
1 共通仕様書の適用	本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。				
2 主任技術者及び監理技術者(以下，配置技術者という。)の配置					
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	○ある		平成 年 月 日 (「3 工程関係」に条件がない場合は，期日以前の着手も可能)		
	●ない	○ある	請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約日から○○日以内 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。		
		●ない	請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1－1－8)		
	上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm				
3 工程関係					
(1) 関連工事による施工時期の調整	◉ある	○ない	特記事項1 (1)のとおり		
(2) 施工時期による制限	○ある	◉ない			
(3) 関係機関等との協議の未成立	◉ある	○ない	本工事のうち、登米市道について規制を行い工事をする必要がある箇所について、受注後、協議が必要である。	登米市との協議終了後に着手すること。	
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加	◉ある	○ない	上記の協議結果によっては条件が付されることがある。		
4 公害対策関係					
(1) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限	◉ある	○ない	特記事項1 (2)のとおり		
5 安全対策関係					
(1) 交通安全施設等の指定	◉ある	○ない	特記事項1 (3)のとおり		
(2) 占用埋設物との近接工事による施工方法，作業時間の制限	○ある	◉ない			
6 排水工関係					
(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性	○ある	◉ない			
7 建設副産物対策関係					
(1) 共通事項	下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。				

				処理・処分する場所	処理・処分方法	距離	制限時間	
				工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。				
(2) 建設発生土	処理・処分		◉ある ○ない		現場内運搬	0.3 km以内	時 分～時 分	
(3) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	○ある ◉ない			km以内	時 分～時 分	
		アスファルト塊	◉ある ○ない	中間処理施設 (登米市米山町)	再生資源化処理	10.5 km以内	時 分～時 分	
		建設発生木材	○ある ◉ない			km	時 分～時 分	
		建設汚泥	○ある ◉ない			km	時 分～時 分	
		その他	○ある ◉ない			km以内	時 分～時 分	
(4) 再生材の利用			◉ある ○ない	種類・数量	種類:再生合材、再生砕石 数量:仕様書、数量計算書のとおり			

項目	条件		内容	施工方法	備考
8 工事現場のイメージアップ	○ある	◉ない	内容 イメージアップの具体的な実施内容，実施期間については，施工計画書に明記し，監督職員と協議すること。		
9 品質証明					
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象	◉ある	○ない	請負工事費が，1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。		
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	◉ない	上記に該当せず，請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。		
10 標準的な設計図書による発注方式	○ある	◉ない	土木工事共通特記仕様書第3編1－1－14によること。		
11 資材関係					
(1) 生コンクリート	生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。				
(2) 購入土	購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。				
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。 「宮城県グリーン製品」を使用した場合は，請負者は環境政策課HPより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力後，工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。	必須		1.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。		
	○ある	◉ない	2. 盛土材,埋め戻し材		
	○ある	◉ない	3. その他( )		
	○ある	◉ない	4. その他( )		
(4) 現場吹付法枠工	吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。				
12 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無					
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象	◉対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」、「標準型」、「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。		
(2) 実施された技術についての費用計上(設計変更)	○対象	◉対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる		

ー 特 記 仕 様 書 ー

施 工 条 件 明 示 書

項　　目	条　件		内　　容	施 行 方 法	備　考
13 その他					
(1)舗装の下請制限について	○ある	◉ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。		
(2)「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無	○ある	◉ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。		
(3)三者会議の対象の有無	○ある	◉ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。		
(4)貸与資料の有無	◉ある	○ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料(『みやぎ県北高速幹線道路(佐沼工区)設計業務委託』 成果品　その他)		
(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	○ある	◉ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。		
(6)工事写真の電子化の対象の有無	◉ある	○ない	本工事の工事写真の作成は，原則として，デジタル写真管理情報基準(案)に基づき電子とすること。ただし，予定価格が8，000万円未満の場合は，監督員との協議により，従来の紙による作成も認めることとする。		
(7)工事実績情報システム(コリンズ)登録	請負者は，工事請負代金額が500万円以上の工事について，工事実績情報サービス(CORINS)に基づき，受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。				
(8)工事書類の簡素化の試行について	◉ある	○ない	1．本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 2．「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また，工事打合簿，材料確認書，段階確認書，立会願，夜間・休日作業届の書類を提出については，電子メール活用を基本とする。 3．これらに定められていない場合は，監督職員と協議するものとする。		

東日本大震災に伴う特例制度

項　　目	条　件		内　　容	施 行 方 法	備　考
14 積算基準及び設計単価の適用期日					
(1)積算基準及び設計単価の適用について	◉ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。		
(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更	◉ある	○ない	本工事は，当初工事請負契約締結後において，契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお，設計変更の対象は，資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価とする。		
15 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	◉ある	○ない	1 本工事は，「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について，契約締結後，労働者確保に要する方策に変更が生じ，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費，宿泊費，借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては，土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。　(道路改良工事) 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費，宿泊費，借上費)の割合:　12.82% 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用)の割合:　1.61% 3 受注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は，実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書，領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し，設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については，設計変更の対象としない。 5 発注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合，受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお，全ての証明書類の提出がない場合であっても，提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は，実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は，監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事	○ある	◉ない	本工事は，「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については，「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
16 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	◉ある	○ない	下記の建設資材は，通常地域内から調達することを想定しているが，安定的な確保を図るために，当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には，事前に監督職員と協議するものとする。また，購入費及び輸送費に要した費用については，証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。なお，添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし，受注者名，納品者名，使用資材名，規格・形状，使用(納品)日，使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し，その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は，生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂，砕石，捨石，被覆石等)とする。 輸送費の対象は，仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は，購入費及び輸送費を変更したい場合は，「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に，建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他，必要と思われる事項	
17 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	◉ない	本工事は，施工箇所が点在する工事であり，共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため，「○○地区(施工箇所○○，○○)，△△地区(施工箇所○○)，□□地区(施工箇所○○)(以下，対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は，対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。 また，現場管理費の金額も同様に，対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお，共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市，施工地域等)については，対象地区毎に設定する。	
18 その他					
(1)機械損料の補正について	◉ある	○ない	本工事で使用するブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)，バックホウ，ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)については運転1時間(日)当たりの損料に105/100 を乗じている。		
(2)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	◉ない	・本工事の施工において，調達(購入)する予定の土砂・砕石の設計単価は，現場持込価格(単価)としている。 ただし，契約後，施工計画に基づき，土砂・砕石の調達条件について異なる場合は，監督職員と協議すること。 ・資材搬入において，標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は，監督職員と協議すること。		
(3)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	◉ある	○ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について，工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し，積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため，積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に，それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数　共通仮設費:1.5　現場管理費:1.2		

特 記 事 項

1 現場条件	
(1) 関連工事について	当該工事箇所において、先行工事及び後発工事を計画しているので、施工時期や手順について関係者と調整のうえ工事を進めること。
(2) 周辺状況について	当該工事箇所は田畑が隣接しているため、油脂類の流出、セメント類の飛散がないよう対策を講じること。
(3) 安全対策について	一般車両や第三者の安全確保のため，必要となる交通誘導員や保安施設等を適切に配置すること。
(4) 事前周知について	工事に先立ち、地元関係住民や登米市および土地改良区などの関係機関に対し、工事内容の説明を行うこと。
2 施工	
(1) 事前測量等について	共通仕様書第1編共通編1－1－37に基づき，事前測量を実施し，測量結果を監督職員に提出すること。 監督職員からの施工図等の作成指示があった場合は，図面作成，数量計算等を実施し，成果を提出すること。
(2) 残土処理について	残土処理については、現場内運搬(運搬距離L=0.3km)としている。 処理場所・処理方法について、変更となる場合は協議事項とする。
(3) 載荷盛土材について	本工事で使用する盛土材は、他事業切土、みやぎ高速幹線道路事業の土砂を計画している。 他事業切土については、登米市登米町内の公共工事から発生する土砂等を流用する計画となっている。(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ L=15.9km) 作業区分として、積込、ダンプトラック運搬を当該工事が行う計画としている。 また、みやぎ高速幹線道路事業の土砂については、近接工事より発生する土砂を流用する計画となっている。 (盛土撤去土 L=0.8km)(仮設道路撤去土 L=1.0km) 作業区分とし、ダンプトラック運搬を当該工事が行う計画としている。 なお、搬出先との工程調整等により、土量が変更になることもあるので留意すること。 (詳細な位置については、監督員より指示する。)
(4) 交通誘導員の配置について	工事施工期間中(搬入・搬出)出入りについては、交通誘導員B(市道)交通誘導員A(国道)を1名配置(計2名)計画している。 交通誘導について、先行・近接工事との工程連絡・報告し誘導による事故の無いよう努めること。
(5) 現場打ち鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄについて	(1)スランプ値 現場打ち鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては，「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月，流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会）」を基本とし，構造物の種類，部材の種類と大きさ，鋼材の配筋条件，コンクリートの運搬，打込み，締固め等の作業条件を適切に考慮し，スランプ値を設定するものとする。 ただし，一般的な鉄筋コンクリート構造物※ においては，スランプ値を12cmとすることを標準とし，レディーミクストコンクリート標準仕様基準によるものとする。 ※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは，共通仕様書等に記載のあるコンクリート舗装工，現場打ち杭等の水中コンクリート及びトンネル覆工を除く。 (2)スランプ値の変更 一般的な鉄筋コンクリート構造物の施工における現場打ちコンクリートのスランプ値を標準の12cmから変更しようとする場合は，コンクリート標準示方書（施工編）の「最小スランプの目安」等に基づき，変更が必要と認められる場合は設計変更の対象とする。
(6) 函渠工について	1号函渠工の掘削土は、本線の路体盛土に流用する。 函渠工の施工は、ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ盛土の沈下（残留沈下10cm以下）が収束をした後に施工をすること。 (詳細については、契約後に報告書を確認すること。)
(7) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ泥落装置(ｽﾊﾟｯﾂ)について	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ泥落装置設置期間は、盛土材(土砂)の搬入・搬出期間を計画している。
(8) 橋台背面・補強土壁盛土材について	橋台背面・補強土壁盛土材について流用土を計画しているので、流用土が盛土適用可能か試験(三軸圧縮試験等)を行い利用可能か確認し施工すること。
(9) 田園の用排水について	当該工事箇所は田畑が隣接しているため、周辺状況を確認し田園の用排水について留意すること。
(10) その他について	疑義が生じた場合は，施工前に監督職員に協議すること。
(11) 暴力団等の排除について	1 乙が、この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月1日施工。(以下、「排除要綱」と言う)。別表各号に該当すると認められたときは、契約を解除することができる。 2 乙は排除要綱別表各号に該当し、宮城県から指名停止措置を受けている者に、この契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負受託をさせた者が、排除要項別表各号に該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めることができる。 3 乙は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者（以下、「暴力団員等」という）。から不当要求を受けたときは、速やかに警察への通報をおこない、捜査上必要な協力をおこなうとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不当 要求又は被害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行延滞等が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、工期の延長等の措置を講ずる。

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工 (ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ盛土)		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30,600		
土砂等運搬 (流用土 運搬距離:L=0.8km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10,500		
土砂等運搬 (流用土 運搬距離:L=1.0km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8,000		
土砂等運搬 (流用土 運搬距離:L=15.9km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		12,070		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3未満	m3		4,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,550		
路体盛土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		6,900		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6,900		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		770		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		770		
背面ｱﾌﾟﾛｰﾁ		式		1		
集水管 (有孔管φ200mm)	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200～400mm	m		45		
集水管 (無孔管φ200mm)	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200～400mm	m		30		
ﾄﾞﾚｰﾝ	材料厚さ:t=50mm	m2		111		
ﾌｨﾙﾀｰ材	材料:C-40, t=10cm	m2		126		
ﾌｨﾙﾀｰ材	材料:C-40, t=50cm	m2		126		

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
吸出防止材	材料厚さ:t=10mm	m2		14		
その他盛土工		式		1		
畦畔盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		190		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		5,630		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
種子散布	種子規格:外・在来種,肥料:無し,施工規模:500m2未満	m2		5,650		
擁壁工		式		1		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工		式		1		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	壁面材の種類:鋼製型枠	m2		104		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格:補強材	m2		541		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格:壁面強化材	m2		131		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		300		
まき出し・敷均し、締固め	土質:流用土	m3		300		
排水管敷設	管種別:波状管,管径:150mm	m		44		
排水材敷設	材質:不織布,規格:3mm	m2		225		
基盤排水層	材料:RC-40,t=600mm	m3		98		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (1号函渠)		式		1		
作業土工		式		1		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		4,900		
基面整正		m2		111		
場所打函渠工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅:5.6m,内空高さ:5.8m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)-55%,養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		317		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t		12.59		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		9.72		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		6.15		
ひび割れ誘発目地	目地の種類:断面欠損部材A,目地板厚さ:厚20mm	m		67		
ひび割れ誘発目地	目地の種類:断面欠損部材B,目地板厚さ:厚100mm	m		64		
ひび割れ誘発目地	目地の種類:埋込化粧材	m		70		
ﾏｯﾄﾚｽ工	基礎厚:0.5m,基礎材:C-40,ﾏｯﾄ材規格:400L型	m2		646		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80		
下層路盤（車道・路肩部）	種類:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40,路盤厚:t=30cm	m2		79		
表層（車道・路肩部）	種類:再生密粒度As20F,舗装厚:t=5cm	m2		79		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝300,3種	m		16		
擁壁工 (1号函渠)		式		1		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工		式		1		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	壁面材の種類:鋼製型枠	m2		86		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格:補強材	m2		345		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格:壁面強化材	m2		92		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		860		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	土質:流用土	m3		860		
排水管等敷設	管種別:塩ビ管,管径:150mm,材料:単粒砕石5号,吸出防止材厚:1.5mm	m		51		
土のう積	規格:植生土のう	m2		2		
排水材敷設	材質:不織布,規格:3mm	m2		91		
基盤排水層	材料:RC-40,t=600mm	m3		85		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		2,500		
埋戻し	土質:土砂	m3		1,500		
基面整正		m2		1,200		
土砂等運搬 (他工事流用)	土質:土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		150		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	U型側溝規格:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形300B	m		122		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B600-H600)	U型側溝規格:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形600	m		12		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B700-H900)	U型側溝規格:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形700×900	m		78		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B700-H1000)	U型側溝規格:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形700×1000	m		150		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)	U型側溝規格:道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝300,1種,蓋の有無:有	m		159		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	U型側溝規格:道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝300,3種,蓋の有無:無	m		237		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B500-H500)	U型側溝規格:道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝300,3種,蓋の有無:無	m		35		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (BF-B300-H200)	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ300,1型	m		36		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (BF-B400-H260)	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ400,1型	m		547		
自由勾配側溝 (US9-B300-H600)	側溝規格:自由勾配側溝300×600	m		19		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
自由勾配側溝 (US9-B700-H1100)	側溝規格:自由勾配側溝700×1100×2000	m		56		
自由勾配側溝 (US9-B1000-H1100)	側溝規格:自由勾配側溝1000×1100×2000	m		24		
自由勾配側溝 (US9-B1000-H1200)	側溝規格:自由勾配側溝1000×1200×2000	m		35		
管渠工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (RCB-B300-H300)	内幅:0.3m,内高:0.3m	m		30		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (RCB-B400-H400)	内幅:0.4m,内高:0.4m	m		18		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (RCB-B700-H700)	内幅:0.7m,内高:0.7m	m		45		
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC-D200)	管規格:外圧管1種	m		8		
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC-D300)	管規格:外圧管1種	m		2		
暗渠排水管 (VUφ150)	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50～150mm	m		4		
暗渠排水管 (VUφ200)	作業区分:据付,管種別:直管,管径:200～400mm	m		2		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
暗渠排水管 (VUφ300)	作業区分:据付,管種別:直管,管径:200～400mm	m		7		
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 (600×600×600 Gr蓋T-2細目)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (600×600×900 Gr蓋T-2細目)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (700×700×600 Gr蓋T-25)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		3		
現場打ち集水桝 (700×700×800 Gr蓋T-25)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (500×500×1000 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (700×700×500 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		3		
現場打ち集水桝 (700×700×500 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		5		
現場打ち集水桝 (700×700×700 Gr蓋T-25)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (700×700×800 Gr蓋T-25)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		2		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 (700×700×900 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (700×700×1000 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (700×700×1200 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (800×800×500 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (800×800×800 Gr蓋T-25)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (800×800×900 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (800×800×1200 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (800×800×1400 Gr蓋T-25)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (800×800×1700 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物4本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1000×1000×500 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1000×1000×800 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 (1000×1000×900 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1100×1100×1200 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物2本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1100×1100×1300 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1100×1100×1800 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物5本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1200×1200×1300 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		3		
現場打ち集水桝 (1200×1200×1600 Gr蓋T-14)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物4本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1400×1400×1300 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1400×1400×1400 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1500×1500×1100 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物2本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1500×1500×1200 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		2		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工（交差道路）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		1,200		
埋戻し	土質:土砂, 区分:B	m3		830		
埋戻し	土質:土砂, 区分:D	m3		10		
土砂等運搬	土質:土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		230		
ﾊﾟｲﾌﾟｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	規格: (R-30)-D900	m		68		
砕石(埋戻し)	種類:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	m3		219		
基面整正		m2		127		
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	管規格:CSB-D450	m		7		
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	管規格:CSB-D900	m		9		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正		m2		22		
呑口桝・吐口桝工		式		1		
現場打ち集水桝 (2500×1300×500～1500)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1000×1000×500～900)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1500×1300×1100～1500)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物3本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1400×1400×1700 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物4本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1400×1400×1700 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物4本	箇所		1		
現場打ち集水桝 (1400×1400×2200 縞鋼板蓋)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し,足掛金物6本	箇所		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路撤去	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,施工数量:10,000m3未満	m3		1,300		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		40		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,240		
迂回路撤去		式		1		
工事用道路撤去	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,施工数量:10,000m3未満	m3		630		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		630		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		50		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2		844		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		42		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		42		
防塵対策工		式		1		
ﾀｲﾔ洗浄装置	装置規格:前後輪ﾀｲﾌﾟ	台		2		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-6工区)工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		式		1		
技術管理費		式		1		
動態観測 (沈下板)	ﾛｯﾄﾞ規格:φ19 L=1.0m	本		170		
動態観測 (変位杭)	口径:9cm	箇所		2		
三軸圧縮試験		資料		3		

宮城県

工事数量総括表（本01）

工事名	みやぎ県北幹線道路（Ⅲ）道路改良（1-6工区）工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

宮城県
