

宮城県道路公社 建設部						みやぎ県北高速幹線道路 工事事務所																																										
部 長		次 長		副 参 事		所 長		技術 副 参 事		技術 副 参 事		技術 主 幹		技術 主 幹		技術 主 幹		設 計 者																														
工 事 仕 様 書																																																
事 業 年 度	令和元年度			工 事 番 号		令和元年度 受(Ⅲ)道第13号																																										
工 事 名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ) 道路改良(3-3工区)工事 実 施 仕 様 書																																															
路 線 名	(主)築館登米線																																															
施 工 地 名	登米市 中田町 石森 地 内																																															
工 期	契約締結の翌日 ~ 令 和 3 年 3 月 25 日 まで 日間																																															
工 事 概 要																																																
別紙のとおり。																																																

工事概要

施工延長 L= 335.2 m 幅員 W=6.5m(8.5m)

路体盛土工(フレート盛土) V= 10,200 m³

植生工 (種子吹付) A= 8,600 m²

ジオテキスタイル補強土壁工(橋台部) A= 175 m²

排水構造物工 一式


下層路盤工 (RC-40) t=71cm A= 2,670 m²

みやぎ県北高速幹線道路

工事区間
道路改良(3~8工区)工事

登米市

位置図

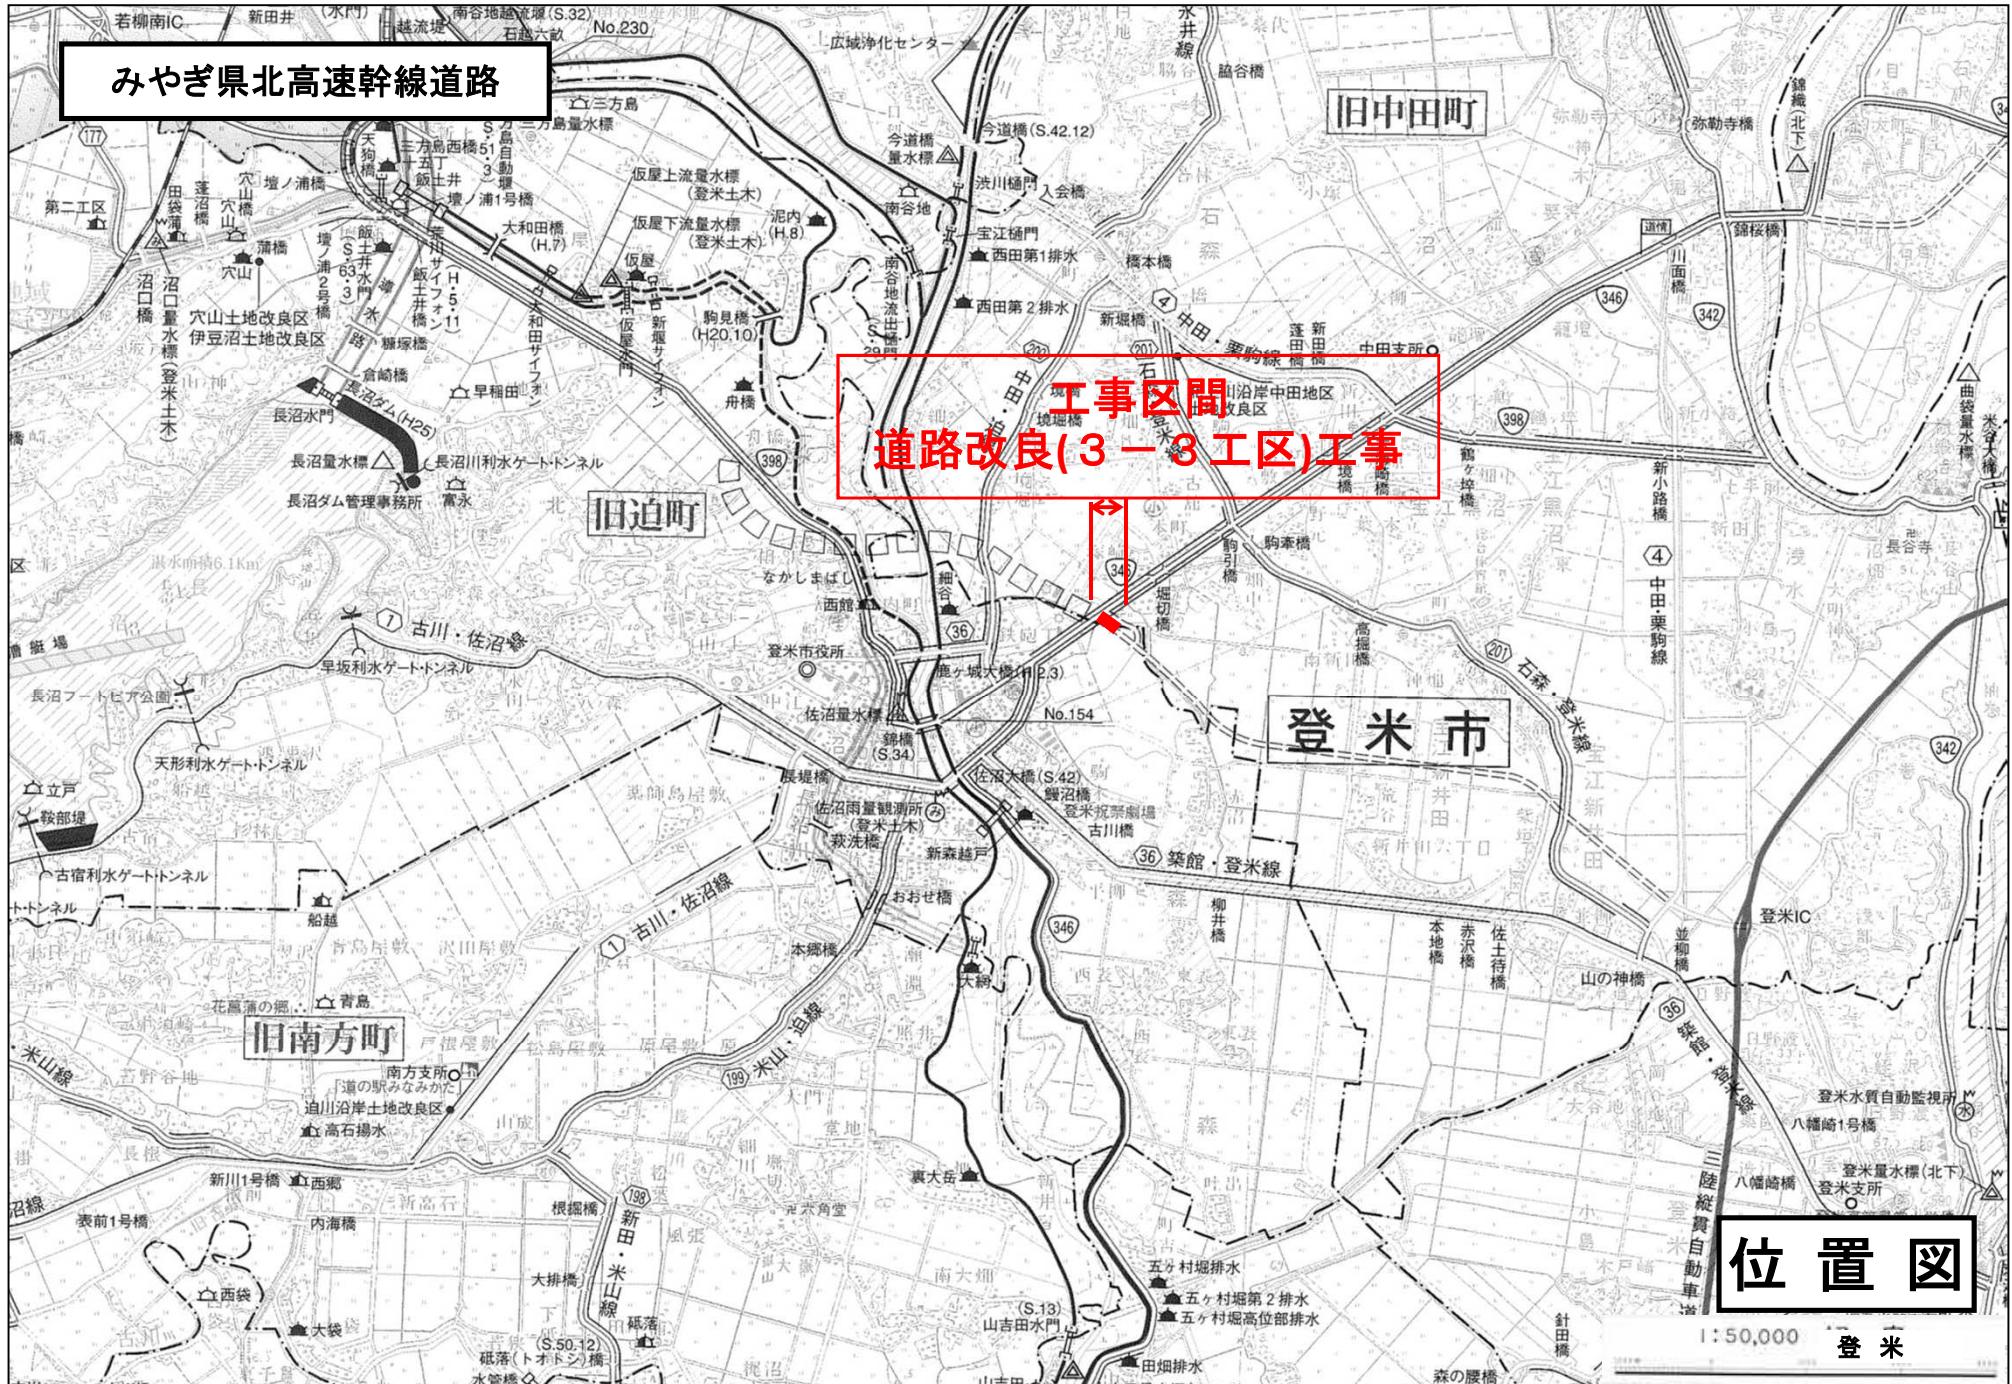

施工条件明示書

特記仕様書

工事番号	令和元年度 受(Ⅲ)道第13号	工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(3-3工区)工事	事務所名	宮城県道路公社										
項目	条件	内容	施工方法	備考											
1 共通仕様書の適用	本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。														
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置	<p>(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例)</p> <p>※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」</p> <table border="1"> <tr> <td>○ある</td><td>平成 年 月 日 (「3 工程関係」に条件がない場合は、期日以前の着手も可能)</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr> <td>●ない</td><td>請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約日から○○日以内 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。</td></tr> <tr> <td>●ない</td><td>請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-8)</td></tr> <tr> <td colspan="3">上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm</td></tr> </table>				○ある	平成 年 月 日 (「3 工程関係」に条件がない場合は、期日以前の着手も可能)		●ない	請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約日から○○日以内 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。	●ない	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-8)	上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。 http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm			
○ある	平成 年 月 日 (「3 工程関係」に条件がない場合は、期日以前の着手も可能)														
●ない	請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約日から○○日以内 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。														
●ない	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-8)														
上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。 http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm															
3 工程関係															
(1) 関連工事による施工時期の調整	◎ある	○ない	特記事項1 (1)のとおり												
(2) 施工時期による制限	○ある	◎ない													
(3) 関係機関等との協議の未成立	○ある	◎ない													
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加	○ある	◎ない													
4 公害対策関係															
(1) 施工方法、機械設置、作業時間等の制限	◎ある	○ない	特記事項1 (2)のとおり												
5 安全対策関係															
(1) 交通安全施設等の指定	◎ある	○ない	特記事項1 (3)のとおり												
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限	○ある	◎ない													
6 排水工関係															
(1) 潟水、湧水処理のための特別な対策の必要性	○ある	◎ない													
7 建設副産物対策関係															
(1) 共通事項	<p>下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>処理・処分する場所</th><th>処理・処分方法</th><th>距離</th><th>制限時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。</td></tr> </tbody> </table>						処理・処分する場所	処理・処分方法	距離	制限時間	工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。				
	処理・処分する場所	処理・処分方法	距離	制限時間											
工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。															
(2) 建設発生土	処理・処分	◎ある	○ない	残土処理施設 (登米市中田町)	残土受入処理	5.5km以内	時 分 ~ 時 分								
(3) 建設発生土以外の 建設副産物	処理・処分	○ある	◎ない	コンクリート塊		km以内	時 分 ~ 時 分								
		○ある	◎ない	アスファルト塊		km以内	時 分 ~ 時 分								
		○ある	◎ない	建設発生木材		km以内	時 分 ~ 時 分								
		○ある	◎ない	建設汚泥		km	時 分 ~ 時 分								
		○ある	◎ない	その他		km	時 分 ~ 時 分								
(4) 再生材の利用	○ある	◎ない	種類・数量	種類:再生砕石	数量:仕様書、数量計算書のとおり	km以内	時 分 ~ 時 分								
8 工事現場のイメージアップ	○ある	◎ない	内容	イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。											
9 品質証明															
(1)品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象	○ある	◎ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。												
(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	◎ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。												
10 標準的な設計図書による発注方式	○ある	◎ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。												
11 資材関係															
(1)生コンクリート	生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。														
(2)購入土	購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。														
(3)宮城県グリーン製品の利用	必須	1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。													
「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。	○ある	◎ない	2.盛土材、埋め戻し材												
「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は環境政策課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。	○ある	◎ない	3.その他()												
(4)現場吹付法棒工	○ある	◎ない	4.その他()												
吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm ² 以上とする。															
12 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無															
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象	◎対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」、「標準型」、「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。												
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	○対象	◎対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる												

施工条件明示書

— 特記仕様書 —

項目	条件	内容		施行方法	備考
13 その他					
(1) 補装の下請制限について	<input type="radio"/> ある <input checked="" type="radio"/> ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。			
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無	<input type="radio"/> ある <input checked="" type="radio"/> ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。			
(3) 三者会議の対象の有無	<input type="radio"/> ある <input checked="" type="radio"/> ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。			
(4) 貸与資料の有無	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料(『みやぎ県北高速幹線道路(佐沼工区)設計業務委託』成果品 その他)			
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	<input type="radio"/> ある <input checked="" type="radio"/> ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。			
(6) 工事写真の電子化の対象の有無	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	本工事の工事写真の作成は、原則として、デジタル写真管理情報基準(案)に基づき電子とすること。ただし、予定期格が8,000万円未満の場合は、監督員との協議により、従来の紙による作成も認めることとする。			
(7) 工事実績情報システム(CORINS)登録	請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。				
(8) 工事書類の簡素化の試行について	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	1. 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 2. 「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿、材料確認書、段階確認書、立会願、夜間・休日作業届の書類を提出については、電子メール活用を基本とする。 3. これらに定められていない場合は、監督職員と協議するものとする。			

東日本大震災に伴う特例制度

項目	条件	内容	実行方法	備考
14 積算基準及び設計単価の適用期日				
(1)積算基準及び設計単価の適用について	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。		
(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価とする。		
15 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	<p>1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち當差賃費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。</p> <p>當差賃費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。(道路改良工事)</p> <p>1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合： <u>12.82%</u></p> <p>2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、<u>1.58%</u>通勤等に要する費用)の割合：</p> <p>3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。</p> <p>5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。</p> <p>6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。</p> <p>7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。</p>		
(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事	<input type="radio"/> ある <input checked="" type="radio"/> ない	本工事は、「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
16 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	<p>下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。</p> <p>購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。</p>	<p>受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。</p> <p>1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項</p>	
17 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	<input type="radio"/> ある <input checked="" type="radio"/> ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「〇〇地区(施工箇所〇〇、〇〇)、△△地区(施工箇所〇〇)、□□地区(施工箇所〇〇)(以下、対象地区といふ)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設费率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
18 その他				
(1)機械損料の補正について	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	本工事で使用するブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)については運転1時間(日)当たりの損料に105/100を乗じている。		
(2)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	<input type="radio"/> ある <input checked="" type="radio"/> ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の土砂・碎石の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、土砂・碎石の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(3)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	<input checked="" type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従つて対象額ごとに求めた共通仮設费率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。	補正係数 共通仮設費:1.5 現場管理費:1.2	

特記事項

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工(本線)		式		1		
路体盛土工 (フ'レート'盛土)		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m ³		10,200		
土砂等運搬 (他工事~現場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		5,400		
土砂等運搬 (現場内)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		4,780		
背面フ'ローチ		式		1		
ト'レン	材料厚さ:t=50mm	m ²		58		
集水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:200mm	m		72		
フィルタ材	材料:C-80, t=80cm	m ²		131		
掘削工		式		1		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満	m ³		5,000		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m ³		90		
土砂等運搬 (現場内)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		90		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m ²		8,800		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		690		
残土等処分		m ³		690		
道路土工(側道)		式		1		
掘削工		式		1		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
掘削	土質:土砂、施工方法:オーブンカット、押土:無し、障害:無し、施工数量:5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満	m ³		2,200		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m ³		190		
土砂等運搬 (現場内)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		190		
その他盛土工		式		1		
畦畔盛土	人力盛土	m ³		50		
路体外盛土		m ³		4		
土砂等運搬 (現場内)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		50		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し、土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²		410		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し、現場制約:無し	m ²		220		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面工		式		1		
植生工 (本線)		式		1		
種子散布 (盛土法面)	種子規格:野芝、肥料:無し、施工規模:1000m ² 以上	m ²		8,600		
植生工 (側道)		式		1		
種子散布	種子規格:野芝、肥料:無し、施工規模:1000m ² 以上	m ²		630		
擁壁工		式		1		
シオテキスタイル補強土壁工		式		1		
シオテキスタイル壁面材組立・設置	壁面材の種類:鋼製型枠	m ²		175		
シオテキスタイル敷設	シオテキスタイル規格:補強材	m ²		571		
シオテキスタイル敷設	シオテキスタイル規格:壁面強化材	m ²		267		
土砂等運搬 (現場内)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		700		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
まき出し・敷均し・締固め	土質:流用土	m3		700		
排水管敷設	管種別:波状管, 管径:150mm	m		78		
排水材敷設	材質:不織布, 規格:1.5mm以上	m2		259		
基盤排水層	材料:RC-40, t=600mm	m3		128		
土のう積	植生土のう	m2		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		320		
埋戻し (区分:C)	土質:土砂	m3		40		
埋戻し (区分:D)	土質:土砂	m3		170		
基面整正		m2		448		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
側溝工		式		1		
ブレキヤストU型側溝 (BF-B300-H200)	U型側溝規格:バンチフリューム300, I型	m		12		
ブレキヤストU型側溝 (BF-B400-H260)	U型側溝規格:バンチフリューム400, I型	m		272		
ブレキヤストU型側溝 (PU1-B300-H300)	U型側溝規格:鉄筋コンクリートU型300B, 蓋の有無:無	m		134		
ブレキヤストU型側溝 (PU3-B300-H300)	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝300, 3種, 蓋の有無:無	m		506		
ブレキヤストU型側溝 (PU3-B500-H500)	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝500, 3種, 蓋の有無:無	m		183		
ブレキヤストU型側溝 (PU3-B500-H600)	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝500, 3種, 蓋の有無:無	m		78		
ブレキヤストU型側溝 (HF-B500-H600)	U型側溝規格:排水フリューム500×600	m		22		
管渠工		式		1		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ブレキヤストボックス (RCB-B300-H300)	内幅:0.3m, 内高:0.3m	m		24		
ブレキヤストボックス (BFB-B400-H360)	内幅:0.4m, 内高:0.36m	m		8		
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種, 90° 固定基礎	m		7		
遠心ボックスカルバート	管規格:CSB-D500	m		7		
集水樹・マンホール工		式		1		
現場打ち集水樹 (500×500×700)	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	箇所		3		
現場打ち集水樹 (600×600×600)	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	箇所		3		
現場打ち集水樹 (600×600×700)	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水樹 (700×700×800)	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水樹 (700×700×1000)	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	箇所		3		
現場打ち集水樹 (800×800×800)	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	箇所		1		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水樹 (800×800×1000)	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	箇所		2		
現場打ち集水樹 (500×500×500)	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	箇所		1		
樹蓋	蓋種類:500×500桟用 Gr蓋T-25	枚		2		
樹蓋	蓋種類:600×600桟用 Gr蓋T-25	枚		1		
樹蓋	蓋種類:700×700桟用 Gr蓋T-25	枚		3		
樹蓋	蓋種類:500×500桟用 Gr蓋T-2 (細目)	枚		1		
樹蓋	蓋種類:600×600桟用 Gr蓋T-2 (細目)	枚		1		
樹蓋	蓋種類:500×500桟用 線鋼板	枚		1		
樹蓋	蓋種類:600×600桟用 線鋼板	枚		2		
樹蓋	蓋種類:700×700桟用 線鋼板	枚		1		
樹蓋	蓋種類:800×800桟用 線鋼板	枚		3		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水工		式		1		
上段路肩柵 (500×500×500 Gr蓋T-25)	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18~8~40~60%,法面作業補正:無し,蓋:有	箇所		1		
下段路肩柵 (500×500×600 Gr蓋T-25)	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18~8~40~60%,法面作業補正:無し,蓋:有	箇所		3		
縦排水 (BF-B300-H200) II型	U型側溝の種類:各種,内幅:300mm,内高:200mm,蓋:有	m		57		
縫手コンクリート	規格:Aタイプ	個		1		
縫手コンクリート	規格:Bタイプ	個		3		
縫手コンクリート	規格:Cタイプ	個		3		
縫手コンクリート	規格:Dタイプ	個		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(III)道路改良(3-3工区)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生グラッシュラン RC-40,仕上り厚:710mm	m2		2,670		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費	敷均, 転圧機械	式		1		
技術管理費		式		1		
動態観測 (沈下板)	ロットφ19 L=1.0m	本		33		

宮城県

工事数量総括表(本01)

工事名	みやぎ県北幹線道路(Ⅲ)道路改良(3-3工区)工事	規格	単位	数量(前回)	事業区分	道路新設・改築 舗装	摘要
					工事区分	数量(今回)	
動態観測 (沈下板)	800×800 t=9mm		箇所		3		
土質試験	試験区分:三軸圧縮試験		資料		1		
現場試験	試験区分:CBR試験		箇所		3		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

宮城県
