

宮城県道路公社															
部		技		課		技術補佐		技術主幹		主任主査		設計者			
長		監		長											
工 事 仕 様 書															
事業年度		令和5年度				工事番号		仙松維第1号							
工事名		仙台松島道路 舗装修繕工事 実施 仕様書													
路線名		(主) 仙台松島線													
施工地名		宮城郡 利府町 春日 ~ 赤沼 地内													
工期		契約締結の翌日 ~ 令和 5 年 12 月 22 日 まで													
工 事 概 要															
別紙のとおり。															

工 事		概 要	
仙台松島道路 舗装修繕工事			
土工部 利府中IC～松島海岸IC(下り線) 施工延長 L=2,009.28m W=8.00～9.50m No.10～No.48+8.80 、No.57+1.90～No.118+4.63 、No.119+2.25～No.120		橋梁部 赤沼橋 施工延長 L=17.62m W=10.00m No.118+4.63～No.119+2.25	
舗装工		舗装工	
路面切削工 (t=10cm)	A= 17,020 m <sup>2</sup>	路面切削工 (t=8cm)	A= 176 m <sup>2</sup>
殻運搬・処分	V= 1,702 m <sup>3</sup>	殻運搬・処分	V= 14 m <sup>3</sup>
オーバーレイ工		橋面防水工 複合防水(浸透型+As加熱型塗膜防水)	A= 176 m <sup>2</sup>
表層工(ホーラスアスファルト混合物(13) t=5cm)	A= 17,020 m <sup>2</sup>	オーバーレイ工	
基層工(密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm)	A= 17,020 m <sup>2</sup>	表層工(密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm)	A= 176 m <sup>2</sup>
区画線工		基層工(密粒度As(13) t=4cm)	A= 176 m <sup>2</sup>
溶融式区画線	L= 5,140 m	区画線工	
		溶融式区画線	L= 42 m
橋梁部 赤沼大橋 施工延長 L=173.1m W=8.79m No.48+8.80～No.57+1.90		ランプ部 松島海岸IC (A, C, Dランプ) 施工延長 L=680.0m W=5.50～7.00m	
舗装工		舗装工	
路面切削工 (t=4cm,8cm)	A= 1,533 m <sup>2</sup>	路面切削工 (t=10cm)	A= 3,810 m <sup>2</sup>
殻運搬・処分	V= 115 m <sup>3</sup>	殻運搬・処分	V= 381 m <sup>3</sup>
橋面防水工 複合防水(浸透型+As加熱型塗膜防水)	A= 1,340 m <sup>2</sup>	オーバーレイ工	
オーバーレイ工		表層工(ホーラスアスファルト混合物(13) t=5cm)	A= 3,810 m <sup>2</sup>
表層工(密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm)	A= 1,530 m <sup>2</sup>	基層工(密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm)	A= 3,810 m <sup>2</sup>
基層工(密粒度As(13) t=4cm)	A= 1,340 m <sup>2</sup>	区画線工	
区画線工		溶融式区画線	L= 1,560 m
溶融式区画線	L= 419 m		

# － 特 記 仕 様 書 －

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号	令和5年度 仙松維第1号	工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事	事務所名	宮城県道路公社					
項 目	条 件	内 容	施 工 方 法	備 考						
1 共通仕様書の適用	本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。									
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置										
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例)  ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	<input type="radio"/> ある	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合は、期日以前の着手も可能)								
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)	<input type="radio"/> ある	契約日から〇〇日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。								
(3) その他	<input checked="" type="radio"/> ある	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手  上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不移動であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html								
3 特例監理技術者の配置										
	<input type="radio"/> 対象	<input checked="" type="radio"/> 対象外	建設業法第26条第3項ただし書の規程を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置。 特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする							
<p>1 特例監理技術者を配置する場合は以下の(ア)～(サ)の要件を全て満たさなければならない。</p> <p>(ア) 本工事の現場施工に着手する日までに、建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。</p> <p>(イ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補(令和3年4月1日施行予定)又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。</p> <p>(ウ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。</p> <p>(エ) 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。</p> <p>(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。))については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)</p> <p>(オ) 特例監理技術者が兼務できる工事は、本工事を所管する宮城県内で施行される工事でなければならない。</p> <p>(カ) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。</p> <p>(キ) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。</p> <p>(ク) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。</p> <p>(ケ) 専任補助者を配置しない工事であること。</p> <p>(コ) 維持管理業務同士は兼務できない。</p> <p>※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等</p> <p>(サ) 配置技術者の追加専任を必要としないもの。</p> <p>2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合、配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。</p> <p>3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。</p>										
4 積算基準及び設計単価の適用期日										
(1) 積算基準及び設計単価の適用について	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。							
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。							
5 工程関係										
(1) 関連工事による施工時期の調整	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	仙台松島道路管理事務所の保全業務委託等との調整							
(2) 施工時期による制限	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	休日および工事抑制期間について、作業を行わないものとする。 但し工事を行う必要がある場合や施工計画上で必要な場合はこの限りではない。	休日作業届を提出のこと。 施工計画書に記載のこと。						
(3) 関係機関等との協議の未成立	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	宮城県警察高速道路交通警察隊との車線規制における協議							
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	上記協議結果によっては、条件が付されることがある。							
6 公害対策関係										
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	各関係法令、条例による。							
7 安全対策関係										
(1) 交通安全施設等の指定	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	宮城県警察高速道路交通警察隊との協議回答及び保安設置計画書による。							
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない								
8 排水工関係										
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	濁水等が発生した際は適切な処理を行うこと。							
9 建設副産物対策関係(建設発生土)										
(1) 建設発生土の処理・処分について	<p>本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難しい場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。</p> <table> <tr> <td>処理・処分場所</td> <td>処理・処分方法</td> <td>距離</td> <td>制限時間</td> <td></td> </tr> </table> <p>工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。</p>					処理・処分場所	処理・処分方法	距離	制限時間	
処理・処分場所	処理・処分方法	距離	制限時間							
(2) 建設発生土	処理・処分	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	km	時 分 ～ 時 分					

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)									
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。						
			処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離	制 限 時 間	
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。						
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない			km	時 分 ～ 分	
		アスファルト塊	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	仙北アスコン共同企業体 (三井住建道路橋東北支店)	中間処理・再生資源化	8.7 km	時 分 ～ 分	
		建設発生木材	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない			km	時 分 ～ 分	
		建設汚泥	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない			km	時 分 ～ 分	
		その他	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない			km	時 分 ～ 分	
(4) 再生材の利用			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	種類・数量				
11 現場環境改善			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	内容 現場環境改善の具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。				
12 品質証明									
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。				
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。				
13 標準的な設計図書による発注方式			<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。				
14 資材関係									
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。						
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。						
(3) 宮城県グリーン製品の利用  「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は環境政策課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			必須		1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。				
			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	2. 盛土材、埋め戻し材				
			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	3. その他( )				
(4) 県内産製品の使用			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 <a href="http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html">http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html</a>				
(5) 現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。						
15 設計変更の手続き									
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。  詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 <a href="https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html">https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html</a> トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】						
16 その他									
(1) 舗装の下請制限について			<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。				
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請契約に関する関係書類を提出すること。  請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。				
(3) 三者会議の対象の有無			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。				
(4) 貸与資料の有無			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料( )				
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無			<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。				
(6) 法定外の労災保険の付保について			本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において、受注者は法定外の労災保険に付なければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。						
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無			<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。				

## 働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1) 「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	<input type="radio"/> 対象	<input checked="" type="radio"/> 対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。「標準型」「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2) 実施された技術についての費用計上(設計変更)	<input type="radio"/> 対象	<input checked="" type="radio"/> 対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化			
(1) 工事情報共有システムの活用	<input type="radio"/> 対象	<input checked="" type="radio"/> 対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2) 工事書類の簡素化の試行について	<input checked="" type="radio"/> ある	<input type="radio"/> ない	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3) ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19 週休2日モデル工事の適用の有無			

(1) 週休2日モデル工事	<input checked="" type="radio"/> 対象	<input type="radio"/> 実施困難工事	<p>1. 週休2日モデル工事の対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日モデル工事」実施要領に基づき行うこととする。 なお、週休2日モデル工事の型式については、下記(2)のとおりする。</p> <p>2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が令和6年4月から建設業に適用されることを踏まえ、令和6年4月には、維持工事等も含めて、週休2日の確保を目指すことから、「週休2日モデル工事」での発注を原則とする。ただし、災害復旧工事など工事期間が限定されるなど確保が難しい場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。</p>
(2) 週休2日モデル工事の型式	<input type="radio"/> 発注者指定型	<input checked="" type="radio"/> 受注者希望型	<p>1. 発注者指定型の場合は、当初積算時に4週8休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。</p> <p>2. 受注者希望型の場合は、設計変更時に達成状況に応じた経費の補正を行うこととする。 なお、(1)が実施困難工事の場合は、当該項目も対象外となる。</p>
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1) 女性活躍推進モデル工事	<input type="radio"/> 対象	<input checked="" type="radio"/> 対象外	<p>実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(<a href="https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/">https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/</a>)で確認のこと。</p>
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事	<input type="radio"/> 対象	<input checked="" type="radio"/> 対象外	<p>実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。</p>
22 建設現場等における遠隔臨場の実施について			
			<p>1. 建設現場における遠隔臨場の実施 「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、『建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領(案)』の内容に従い実施する。</p> <p>2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目 現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。</p> <p>3. 実施内容 (1) 段階確認・材料確認、立会での確認 受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声等をWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。 (2) 機器の準備 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。 (3) 遠隔臨場を中断した場合の対応 電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 (4) 効果の検証 遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員等の指示による。 (5) 費用 遠隔臨場にかかる費用については、標準積算基準の率計上に含まれる。なお、通信環境確保のための中継局を設置する場合などは、現場条件により積み上げにより計上する場合もあることから、事前に監督職員と協議すること。 (6) 不正行為 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、県内規(不良不適格業者排除マニュアル等)に従い、処分を実施する場合がある。</p>

## 東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件	内 容	施 行 方 法	備 考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	<p>1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。</p> <p>営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。</p> <p>1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: <u>0.00%</u> 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: <u>0.00%</u></p> <p>3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。</p> <p>5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。</p> <p>6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。</p> <p>7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。</p>	
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない	<p>本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。</p>	




24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	<p>下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。</p> <p>購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。</p> <p>輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。</p>	<p>受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。</p> <p>1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)</p> <p>2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)</p> <p>3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由</p> <p>4 製造・生産工場を選定した理由</p> <p>5 見積もり書</p> <p>6 その他、必要と思われる事項</p>
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	●ない	<p>本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。</p>	<p>本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。</p>
26 その他				
(1) 機械損料の補正について	●ある	○ない	<p>本工事で使用するブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)については運転1時間(日)当たりの損料に105/100 を乗じている。</p>	
(2) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	<p>・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。</p> <p>・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。</p>	
(3) 東日本大震災の復興・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない	<p>間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。</p> <p>補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1</p>	
(4) 主たる工種について			主たる工種は「舗装工事」としている。	

## 特記事項

項 目	内 容	施 工 方 法	備 考
27 住民への配慮について			
(1) 工事区間における対応	・工事施工箇所は、三陸道の供用区間を車線規制して施工するため、一般車との接触事故等を防止すること。	保安施設設置計画書を作成のうえ、監督職員の承諾を得て、看板等を設置すること。	
(2) 住民への配慮	・工事実施にあたり近隣住民への騒音対策に配慮すること。	工事中のトラブル発生の防止を図ること。	
(3) 現場内の管理	・三陸道本線部からの荷卸し及び積込みにについて、現場手前から交通規制が必要となるため、交通規制現場の管理を徹底し、事故を未然に防止すること。	工事中のトラブル発生の防止を図ること。	
28 安全管理の徹底			
(1) 労働災害について	・工事請負者は工事の円滑な運営及び労働災害の防止に努めること。		
(2) 交通安全管理について	・工事施工箇所は、三陸道の交通規制管理が必要なことから交通誘導員を配置し、交通安全確保に十分に留意すること。	保安施設設置計画書を提出のこと。	
29 建設副産物の処理			
(1) 建設副産物処理の報告	・建設廃棄物等を処理した場合は「建設廃棄物等処理結果報告書」、「マニフェスト」、「処理状況写真」を提出のこと。		
30 安全費について			
(1) 安全費(積上げ)の計上について	<p>・本工事の交通誘導員は、施工日数×1日当りの配置人数とし、1日当りの配置人数は以下のとおりである。</p> <p>本線部については舗装修繕施工時:4名、測量等・区画線施工時:3名。</p> <p>ランプ部については3名。</p> <p>なお、誘導員の人数については、協議のうえ変更対象とする。</p>	保安施設設置計画書に交通誘導員の配置を明記すること。	
31 施工条件について			
(1) 事前調査について	・事前に現場状況を調査して、施工方法等の確認を行うこと。	監督職員と協議のうえ施工すること。	
(2) 作業時間について	・作業可能時間は原則として、本線部についてはAM8:30～PM5:00(後片付け含む)、ランプ部については、PM9:00～AM6:00(後片付け含む)とする。		
(3) 工事工程について	・施工にあたっては、現場状況と工事工程を確認し、施工計画を立案するものとする。工事時期の計画に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。	監督職員と協議のうえ施工すること。	
(4) 施工区間の規制について	<p>・本線部の交通規制については、朝夕の交通渋滞を緩和するため、工事施工区間を2分割して工区毎に交通規制を行うものとする。</p> <p>なお、三陸道本線からの進入、退出は危険が伴うので交通規制について、安全確保に留意すること。</p>	保安施設設置計画書を提出のこと。	

32 その他			
(1) 現場代理人の常駐緩和	・この工事は、「現場代理人の常駐義務の緩和措置」についての該当工事である。		
(2) 暴力団等の排除について	<p>1 受注者が、この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月1日施工。（以下、「排除要綱」と言う）。別表各号に該当すると認められたときは、契約を解除することができる。</p> <p>2 受注者は排除要綱別表各号に該当し、本県から指名停止措置を受けている者に、この契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負受託をさせた者が、排除要項別表各号に該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めることができる。</p> <p>3 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者（以下、「暴力団員等」という）。から不当要求を受けたときは、速やかに警察への通報をおこない、捜査上必要な協力をおこなうとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不当要求又は被害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行延滞等が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、工期の延長等の措置を講ずる。</p>		
(3) 成果品について	・印刷物の他、工事完成書類の各種納品物を電子データとして電子媒体に納め、提出するものとする。	監督職員の確認を得ること。	
(4) 使用材料、施工方法について	・使用材料、施工方法について、設計図書に記載されているものと同等品以上のものを使用することとするが、現地調査により、別の材料、別の工法で施工する場合については、監督職員の承諾を得ること。	監督職員の承諾を得ること。	
(5) 有料道路の料金について	・有料道路料金については、本線部1工区分として利府中ICから松島海岸IC間に普通車5台／日、中型車13台、大型車355台（As搬入出等）、特大型2台を、本線部2工区分として利府中ICから松島大郷IC間に普通車5台／日、中型車7台、大型車518台（As搬入出等）、特大型2台を、ランプ部として利府中ICから松島海岸IC間に普通車5台／日、中型車2台、大型車186台（As搬入出等）、特大型2台を概算計上している。なお、料金は施工日数、台数により精算をするものとする。		



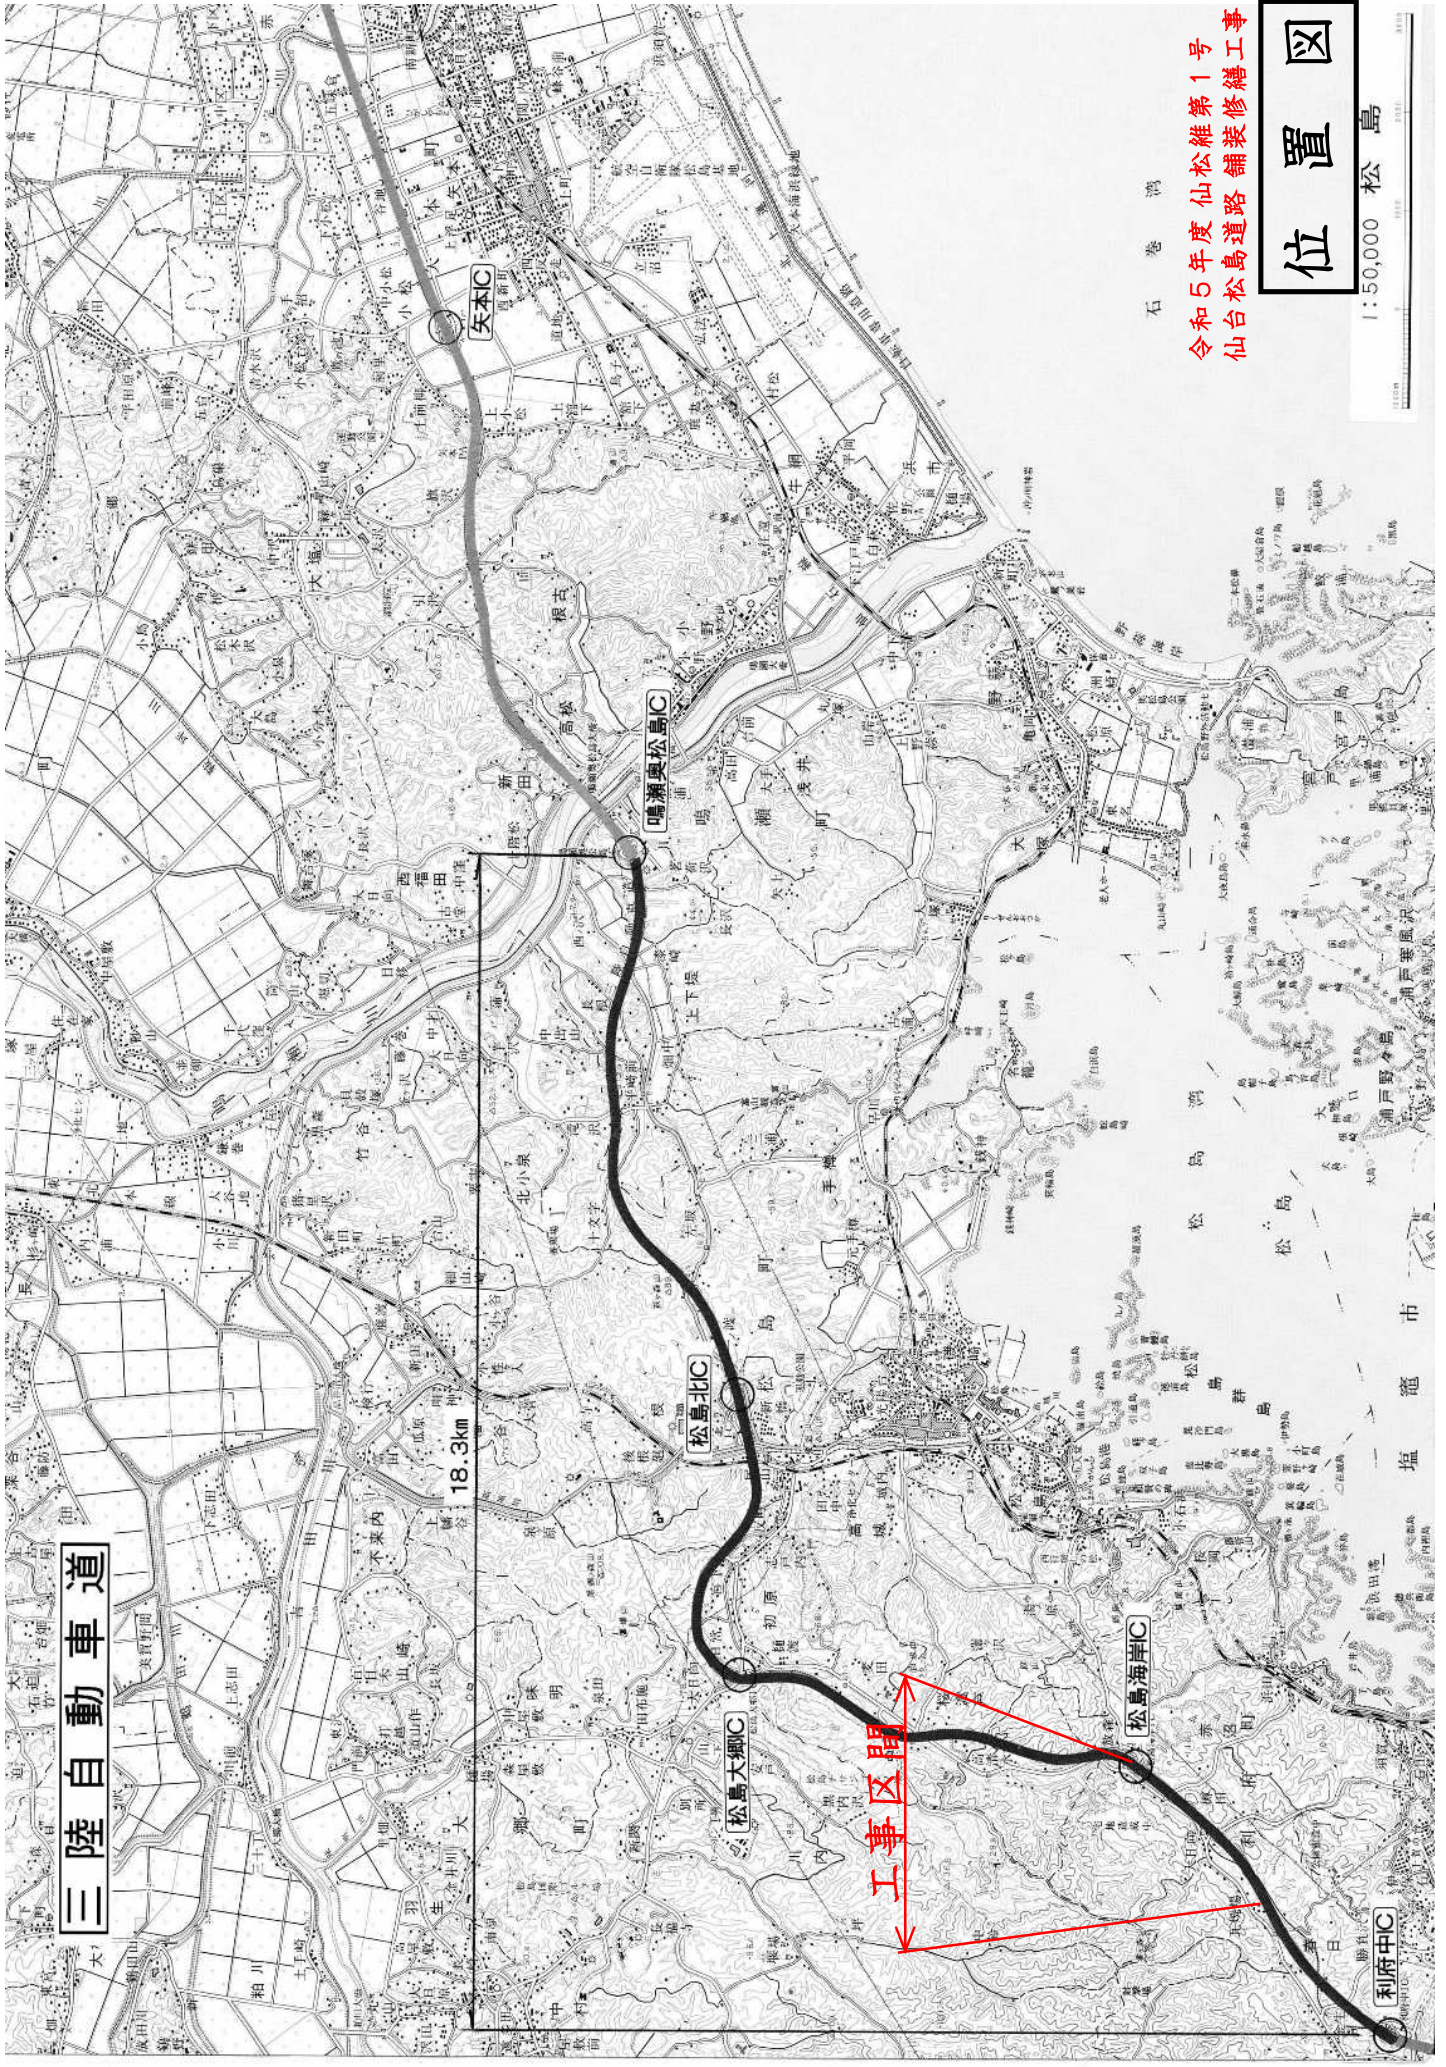

三陸自動車道

18.3km

工事区間

石巻湾

令和5年度仙松維第1号  
仙台松島道路舗装修繕工事

位置図

1:50,000 松島

利府IC

鳴瀬川松島C

松島北IC

松島大郷C

松島海岸C



工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工		土工部 利府中IC～松島海岸IC(ドリ線)	式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		17,020		
穀運搬(路面切削)		穀種別:アスファルト穀	m3		1,702		
穀処分		穀種別:アスファルト穀	m3		1,702		
オーバーレイ工			式		1		
表層工(車道・路肩)		ポーチラスアスファルト混合物(13),舗装厚:50mm	m2		17,020		
基層(車道・路肩部)		材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		17,020		
クラック処理(シート張)		W=0.5m	m		100		
区画線工		土工部 利府中～松島海岸IC(ドリ線)	式		1		

宮城県

工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m		4,150		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m		800		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 20cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m		110		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m		52		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ビブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m		28		
舗装工		橋梁部 赤沼大橋(下り線)	式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,340		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		193		
搬運搬(路面切削)		搬種別:アスファルト搬	m3		115		

宮城県

工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷処分		殻種別:アスファルト殻	m3		115		
橋面防水工			式		1		
床版防水層		複合防水	m <sup>2</sup>		1,340		
導水パイプ		φ18mmステンレス	m		151		
成型目地材		幅35mm×厚5mm	m		322		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒アスコン 改質Ⅱ型(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,530		
基層(車道・路肩部)		材料種類:密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,340		
区画線工		橋梁部 赤沼大橋(下り線)	式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		350		

宮城県

工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		69		
舗装工		橋梁部 赤沼橋(下り線)	式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		176		
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻	m3		14		
敷処分		殻種別:アスファルト殻	m3		14		
橋面防水工			式		1		
床版防水工		複合防水	m <sup>2</sup>		176		
導水パイプ		φ18mmステンレス	m		16		
成型目地材		幅35mm×厚5mm	m		38		
オーバーレイ工			式		1		

宮城県

工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層工 (車道・路肩)		材料種類:各種 (2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度75%改質Ⅱ型(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		176		
基層工 (車道・路肩)		材料種類:密粒度75%以上混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m <sup>2</sup>		176		
区画線工		橋梁部 赤沼橋(下り線)	式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		35		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		7		
舗装工		ランプ部 松島海岸IC (A, C, Dランプ)	式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		3,810		
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻	m3		381		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		381		

宮城県

工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
オーバーレイ工			式		1		
表層工 (車道・路肩)		ポーラスアスファルト混合物(13),舗装厚:50mm	m2		3,810		
基層(車道・路肩部)		材料種類:改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		3,810		
クラック処理 (シート張)		W=0.5m	m		70		
区画線工		ランプ部 松島海岸IC (A, C, Dランプ)	式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m		1,360		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m		200		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A (昼間) 本線部 1 上区	式		1		

宮城県



工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A (昼間) 本線部 2 工区	式		1		
交通誘導警備員		A (夜間) ランプ部	式		1		
交通誘導警備員		B (昼間) 本線部 1 工区	式		1		
交通誘導警備員		B (昼間) 本線部 2 工区	式		1		
交通誘導警備員		B (夜間) ランプ部	式		1		
交通規制工			式		1		
交通規制材		本線部 1 工区	式		1		
交通規制材		本線部 2 工区	式		1		
交通規制材		ランプ部	式		1		
有料道路料金			式		1		
有料道路料金		本線部 1 工区	式		1		

宮城県

工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
有料道路料金		本線部 2 工区	式		1		
有料道路料金		ランプ部	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費		本線部 1 工区	台		2		
建設機械運搬費		本線部 2 工区	台		2		
建設機械運搬費		ランプ部	台		2		
技術管理費			式		1		
現場技術業務費		測点間隔20m, 測量幅45m以下	km		2.81		

宮城県

工事数量総括表(春日～赤沼)

工事名	仙台松島道路 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		
